

# 项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

## 一、任命

现任命 李映达 同志，担任 镇沅县若东镇宏发加油站现状评价项目 组长。

## 二、授权范围

1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。

3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。

4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2022年4月10日

# 一 基本情况记录表

## 1 企业概况

项目名称: 镇沅彝族自治县镇沅镇普安加油站  
项目类型: 安全现状评价 企业性质: 个人独资企业  
投资金额: 1 法定代表人: 吴青松  
住所: 镇沅县镇沅镇普安村  
筹建或建成投产时间 2007.5.23  
生产经营类型: 加油站  
生产能力或设计规模: 三级站  
生产经营的主要产品、物料 汽油(92#、95#)、柴油(0#)  
证照或核准情况: 有营业执照、成品油证、危化证。

每年最大生产时间 365 天, 每天工作 2 班 (8 小时)。人员编制: 管理人员 2 人、生产人员 4 人。  
专职安全员 1 人, 兼职安全员 0 人。


## 2 地理位置及交通

项目所在地距 镇沅<sup>城</sup> 城市约 50 公里, 位于 (要求细化到小地名或社区) 镇沅县镇沅镇普安村。

地理坐标: 东经 101°17'15"、北纬 23°59'51"

交通: 车通为033国道

交通位置示意图

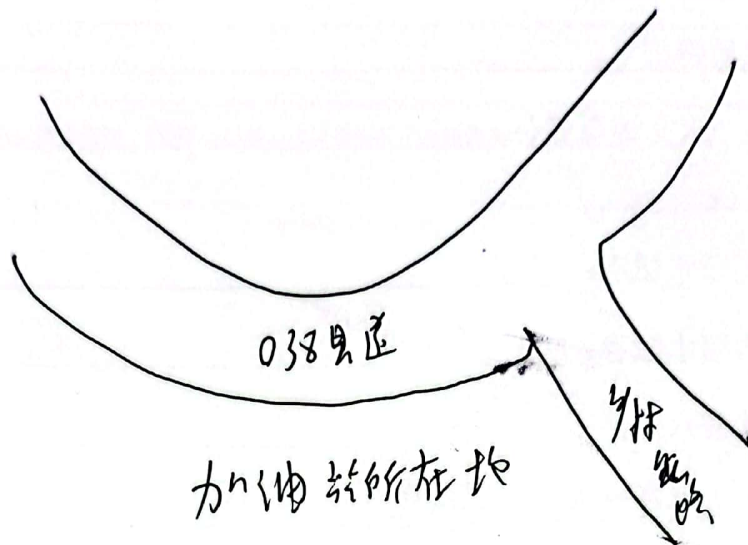

注：为便于分析周边区域的情况、项目周边交通关系，手工绘出较小范围内的交通位置示意图，同时要求标出相对距离。

### 3 自然地理

地形地貌：是否提供了相关资料？（是□、否）是否有现场踏勘后或收集的补充记录

（是□、否）。东北向西南低，西面、西北面地势低于加油站，没有挡土墙，站内地势低于站前道路。

气象条件：是否提供了相关资料？（是□、否）是否有现场踏勘后或收集的补充记录

（是□、否）。经查询，当地最高气温30℃，最低气温6℃，平均气温15℃。

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？（是□、否）是否有现场踏勘后或收

集的补充记录 (是□、否)

(1) 地层

(2) 构造

(3) 地质特征

3.2 水文地质条件 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否)

(1) 孔隙水赋存:

(2) 岩溶水赋存:

(3) 地表水体: 无

(4) 水文条件类型: 简单

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否)

(1) 工程地质岩组:

(2) 边坡稳定性分析: 现场检查有裂缝等不良地质情况, 应注意西面、西北面坡体

(3) 工程地质条件类型: 简单

3.4 环境地质条件 是否提供了相关资料? (是、否□) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否)

(1) 调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: 现场检查时  
未发现, 塌陷

(2) 不良地质作用: 无

(3) 对环境污染情况: 无

(4) 历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: 无

(5) 其它重要的民用或工业建筑的情况: 无




(6) 环境地质条件类型: 简单


4 周边环境:

---

---

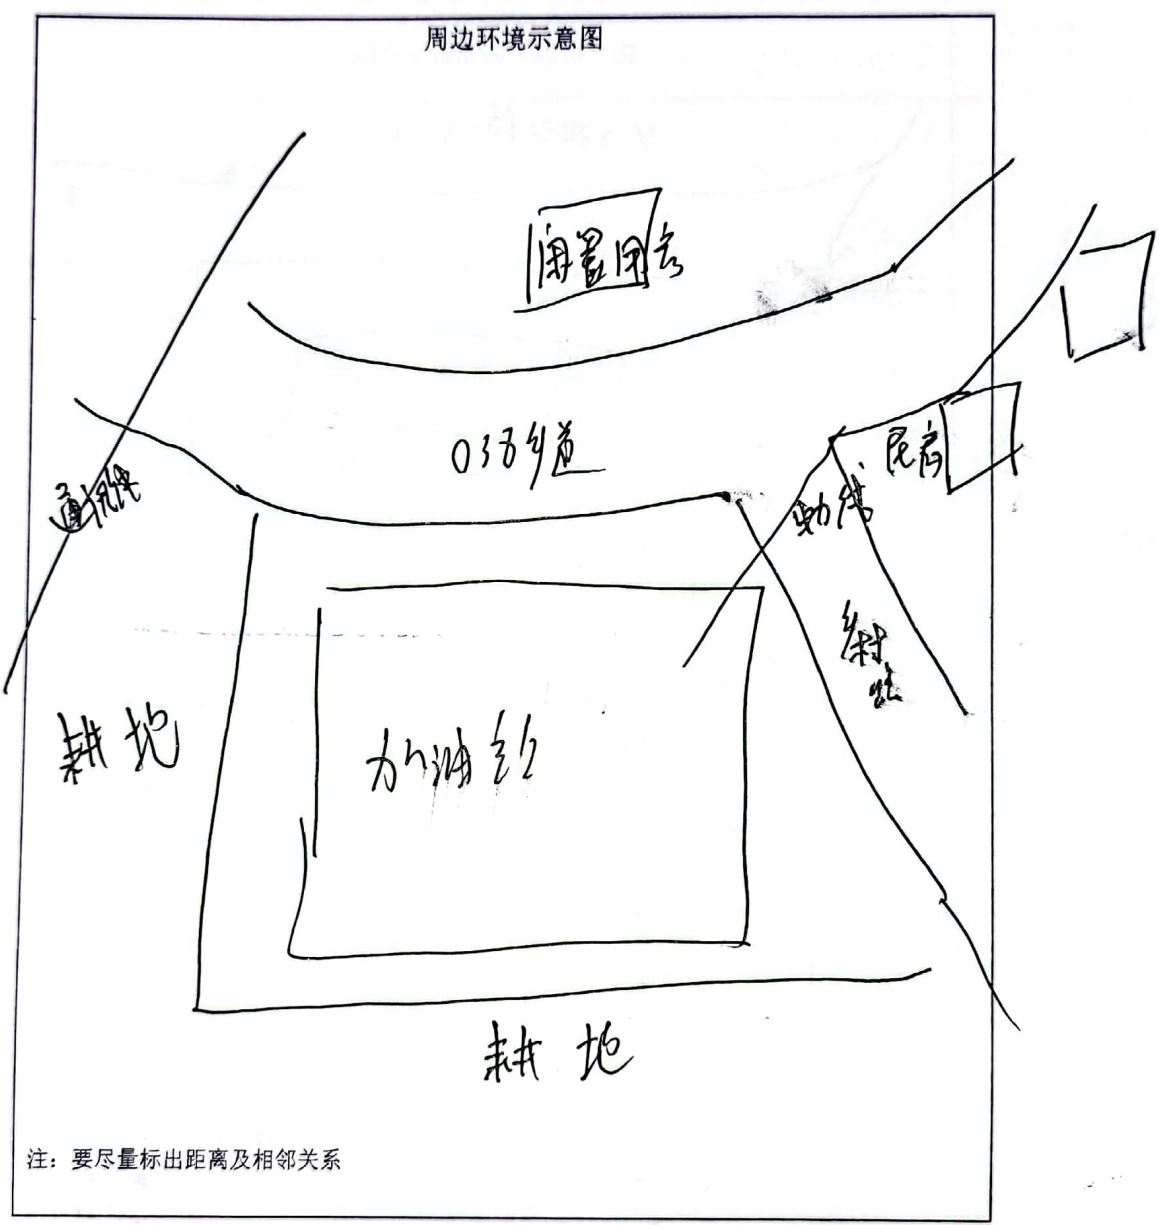

5. 生产区域平面布置情况:

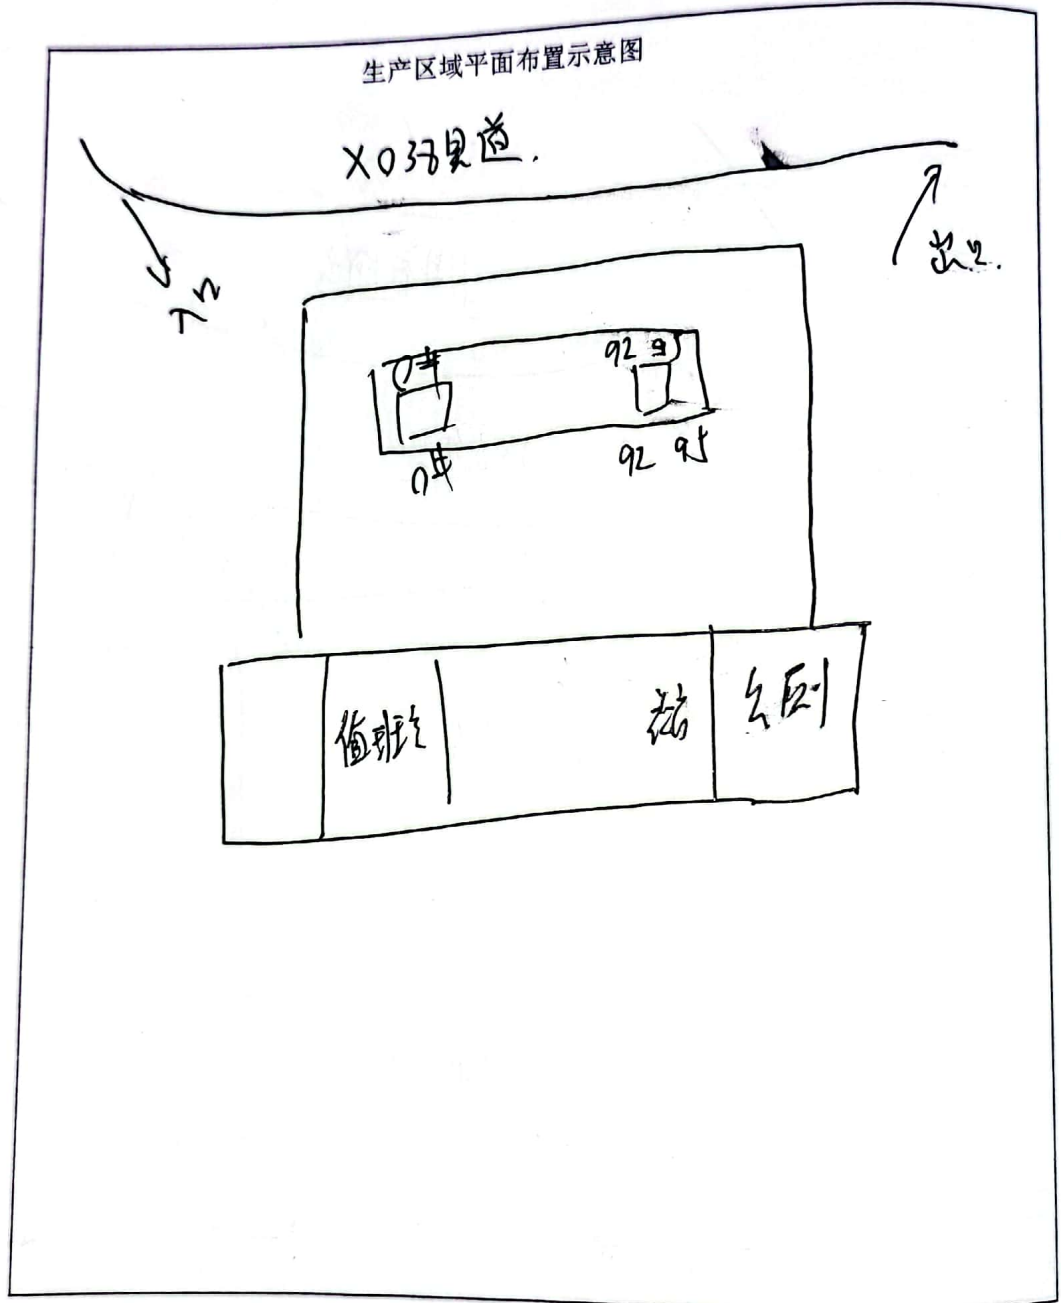


6. 仓储区域平面布置情况: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

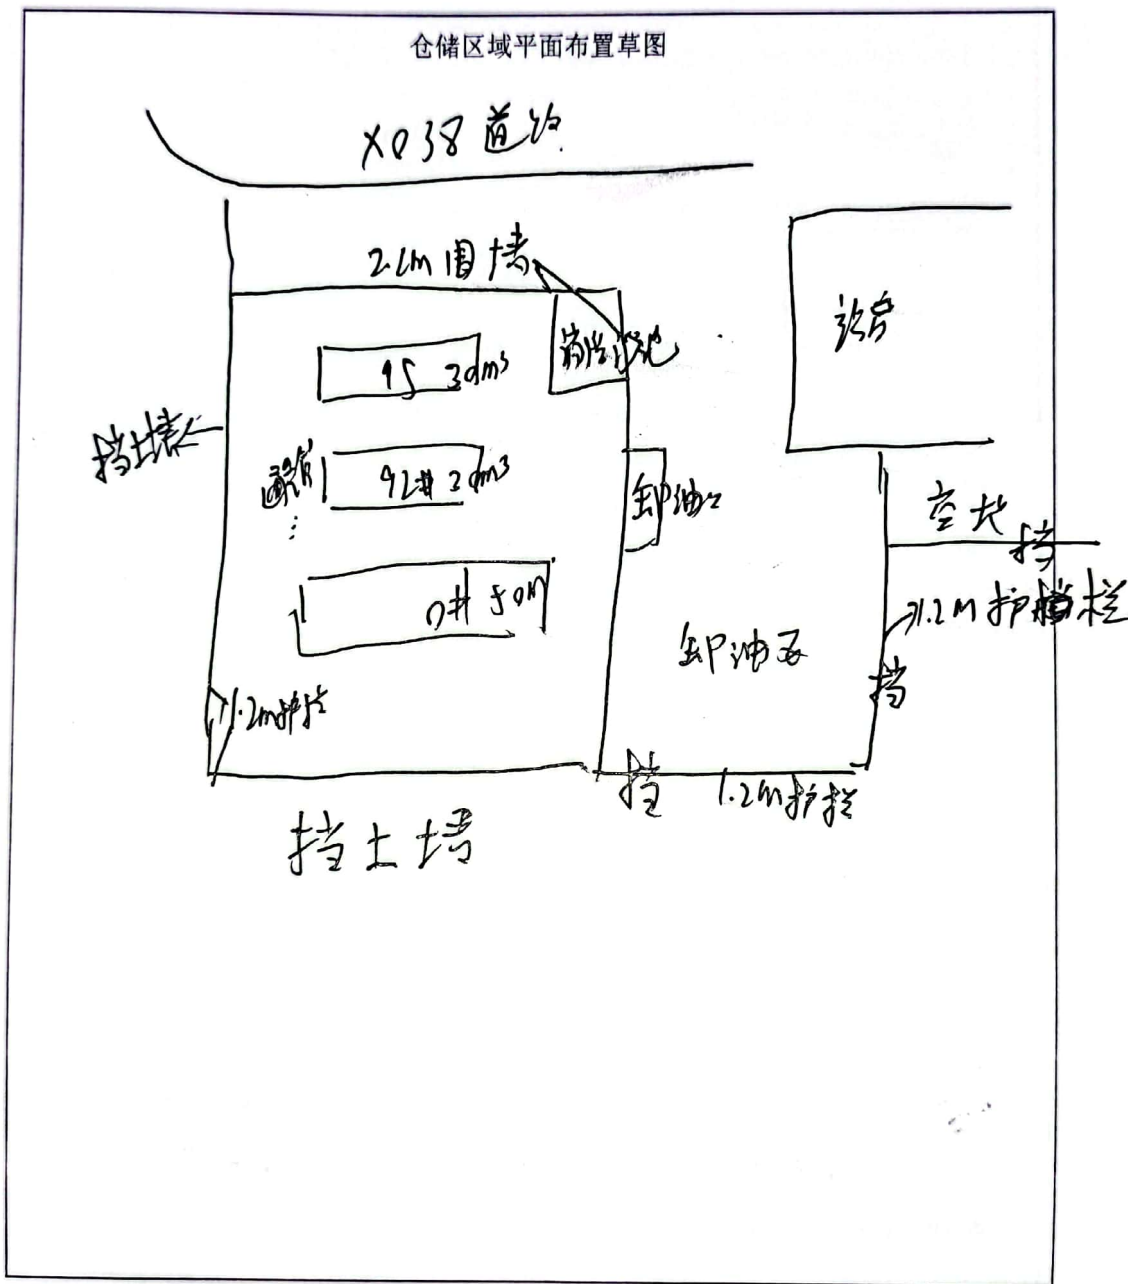





11. 供电

项目用电为 三级负荷, TN-S 系统 供给, 配电室设置在 药库内, 变压器设置情况 无。变压后, 电压为 380/220 V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况 (或排土场) 情况

1. 废气油油气回收.  
2. 设隔油池.

13. 供排水情况: 是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否□)。

供水: 引自当地供水  
排水: 设隔油池处理后外排.

## 14. 安全生产管理

### (1) 安全管理组织机构

设安全管理小组，并由王铁

### (2) 从业人员安全教育及持证情况

主要负责人王铁无持证上岗。

从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作时间 有效期	安全培训机构	证号 发证单位
1	吴春玲	主要负责人		2023.8.9		善调书应急管理局
2	余尊群	安全员		2023.7.6		邓州市应急管理局
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。

(3) 安全管理制度建设情况 (责任制、管理制度、操作规程等) :

建有管理制度, 基本健全

(4) 安全生产资金提取及使用情况: 已按要求提取使用

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况: 已按要求发放

(6) 安全警示标志设置情况: 基本齐全 部份标识褪色

(7) 事故应急救援预案情况: 已编制预案, 并备案, 提供演练记录

(8) 记录、档案、台帐建设情况: 基本齐全

(9) 购买保险情况: 已购买工伤保险







# 昭通市鼎安科技有限公司

## 安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 镇远县若车镇新加坡 项目类型: 现状评价  
法定代表人(负责人) 吴春玲 联系电话: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

现场发现的问题及建议:

- 1) 进出口标识有误 更换
- 2) 部分警示标识褪色 更换
- 3) 静电接地报警仪不能报警 更换电池

委托方负责人: 余春森

现场检查人员: 李凌达

昭通市鼎安科技有限公司

2022年5月19日

注: 本建议书一式三份, 请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认, 本检查建议书将报送安全生产监督管理局。
